


Comune di COPERTINO  
Prov. di Lecce

## ***Nuovo Ampliamento del Cimitero Comunale***

*Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, del D.P.R n. 285/90  
Legge n.130 del 30 marzo 2001  
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34*

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO I STRALCIO**

Progetto: ing. Antonio Verdesca  
Geom. Sandro Pagano  
Geom. Luca Conte  
UTC - Copertino (Le)

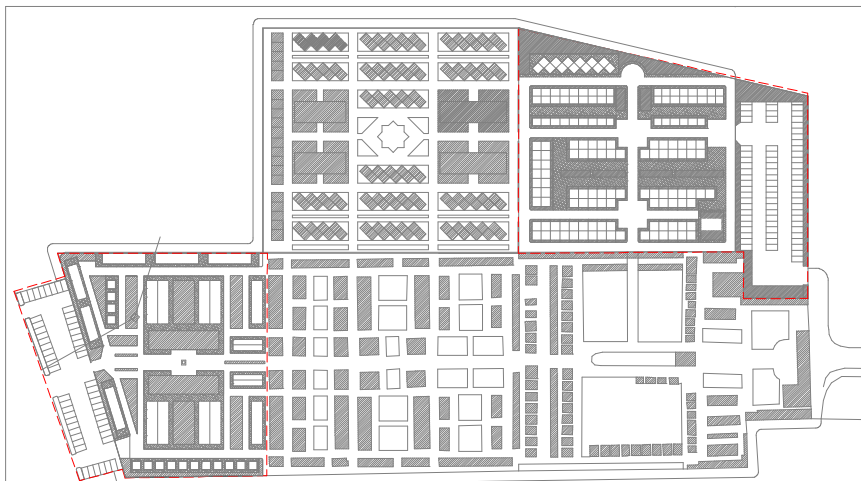

### ***All. 6 RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO RELAZIONE CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO***

*(Regolamento DPR 207/2010)*

**Comune di Copertino**

**Provincia di Lecce**

# **RELAZIONE CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico  
(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte -  
UTC Copertino)

---

# Comune di Copertino

## Provincia di Lecce

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

## RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 149'895,43 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 457'547,23 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

### **Prezzo Chiuso**

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 1'798'745,11;
- anno 2 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico

(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano,  
geom. Luca Conte - UTC Copertino)

**Comune di Copertino**

**Provincia di Lecce**

# **RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO**

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico  
(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte -  
UTC Copertino)

---

Progetto Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale  
I Stralcio Esecutivo - Lavorazioni e Somministrazioni

# Comune di Copertino

## Provincia di Lecce

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

**IMPRESA:**

## RELAZIONE

### PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

## Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 149'895,43 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 457'547,23 .

## Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 200'000,00. Si riportano in seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- **SAL** n. 1 alla data 05/02/2014 **Importo** euro 201'143,57 - **Progressivo** euro 201'143,57.
- **SAL** n. 2 alla data 07/05/2014 **Importo** euro 201'618,56 - **Progressivo** euro 402'762,13.
- **SAL** n. 3 alla data 25/06/2014 **Importo** euro 206'121,38 - **Progressivo** euro 608'883,51.
- **SAL** n. 4 alla data 08/07/2014 **Importo** euro 200'537,28 - **Progressivo** euro 809'420,79.
- **SAL** n. 5 alla data 22/07/2014 **Importo** euro 208'320,74 - **Progressivo** euro 1'017'741,53.
- **SAL** n. 6 alla data 08/08/2014 **Importo** euro 209'380,33 - **Progressivo** euro 1'227'121,86.
- **SAL** n. 7 alla data 01/09/2014 **Importo** euro 211'250,12 - **Progressivo** euro 1'438'371,99.
- **SAL** n. 8 alla data 25/09/2014 **Importo** euro 200'282,54 - **Progressivo** euro 1'638'654,53.
- **SAL** n. 9 alla data 18/11/2014 **Importo** euro 160'090,58 - **Progressivo** euro 1'798'745,11.

Copertino, 25/08/2013

L'Impresa  
( )

VISTO:  
Il Direttore dei Lavori  
(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano,  
geom. Luca Conte - UTC Copertino)

**Comune di Copertino**

**Provincia di Lecce**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico

(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte -

UTC Copertino)

---


Progetto Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale  
I Stralcio Esecutivo - Lavorazioni e Somministrazioni



ID	Nome attività	Durata	Importo	Ott 2013 - Dic 2013			Gen 2014 - Mar 2014			Apr 2014 - Giu 2014			Lug 2014 - Set 2014			Ott 2014 - Dic 2014		
				Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov		
1	<b>Lavori a CORPO</b>	<b>252 g</b>	<b>798'745,0</b>															
2	<b>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMU</b>	<b>252 g</b>	<b>798'745,0</b>															
3	<b>MOVIMENTO TERRE - VIABILITA'</b>	<b>252 g</b>	<b>595'274,98</b>															
4	<b>OPERE STRADALI</b>	<b>252 g</b>	<b>216'890,43</b>															
5	Impianto di cantiere	4 g	18'000,00															
6	Scavo di sbancamento €	14 g	37'052,23															
7	Scavo a sezione obbliga	25 g	8'158,95															
8	Formazione di colmate e	23 g	3'351,55															
9	Formazione di colmate e	23 g	38'442,71															
10	Costruzione di sottofond	28 g	24'963,22															
11	Strato di fondazione in rr	18 g	16'207,64															
12	Compattazione del pianc	10 g	4'007,86															
13	Cilindratura meccanica c	13 g	4'471,07															
14	Trasporto con qualunqu	6 g	15'871,07															
15	Smaltimento di materiale	6 g	25'205,33															
16	Conglomerato bituminos	5 g	11'865,00															
17	Conglomerato bituminos	5 g	8'631,00															
18	Barriera di sicurezza in e	7 g	662,80															
19	<b>OPERE EDILI: Parti Struttur</b>	<b>154 g</b>	<b>133'005,93</b>															
20	Demolizione totale o par	13 g	6'086,54															
21	Fornitura e posa in oper:	44 g	16'573,76															
22	Fornitura e posa in oper:	83 g	36'845,40															
23	FORMAZIONE di copert	23 g	4'860,00															
24	Fornitura e posa in oper:	18 g	6'250,00															
25	Fornitura e posa in oper:	42 g	30'234,20															
26	Fornitura e posa in oper:	42 g	32'156,03															
27	<b>OPERE IDRAULICHE DI SM/</b>	<b>110 g</b>	<b>95'094,25</b>															
28	Fornitura e posa in oper:	25 g	374,49															
29	Fornitura e posa in oper:	25 g	40,24															
30	Fornitura e posa in oper:	25 g	632,16															
31	Fornitura e posa in oper:	26 g	865,80															
32	Fornitura e posa in oper:	26 g	5'778,08															
33	Fornitura e posa in oper:	25 g	3'903,20															
34	Chiusini in ghisa sferoid	25 g	2'632,40															
35	Realizzazione con forniti	33 g	2'646,00															
36	Fossa Imhoff biologica p	10 g	2'167,36															
37	Realizzazione con forniti	84 g	19'470,00															
38	Fornitura e posa in oper:	22 g	1'200,00															
39	Fornitura e posa in oper:	13 g	4'413,73															
40	Scavo a sezione obbliga	35 g	2'747,17															
41	Fornitura e posa in oper:	34 g	11'730,00															
42	Fornitura e posa in oper:	30 g	544,83															
43	Fornitura e posa in oper:	29 g	5'776,40															
44	Fornitura e posa in oper:	25 g	11'688,30															
45	Fornitura e posa in oper:	25 g	4'377,51															
46	Forniti e posa in opera d	15 g	1'463,13															
47	Formazione di rinfianchi	5 g	4'954,02															
48	Rinterro di scavi in prese	25 g	6'315,98															
49	Trasporto a discarica au	5 g	969,49															
50	Smaltimento di materiale	4 g	403,96															





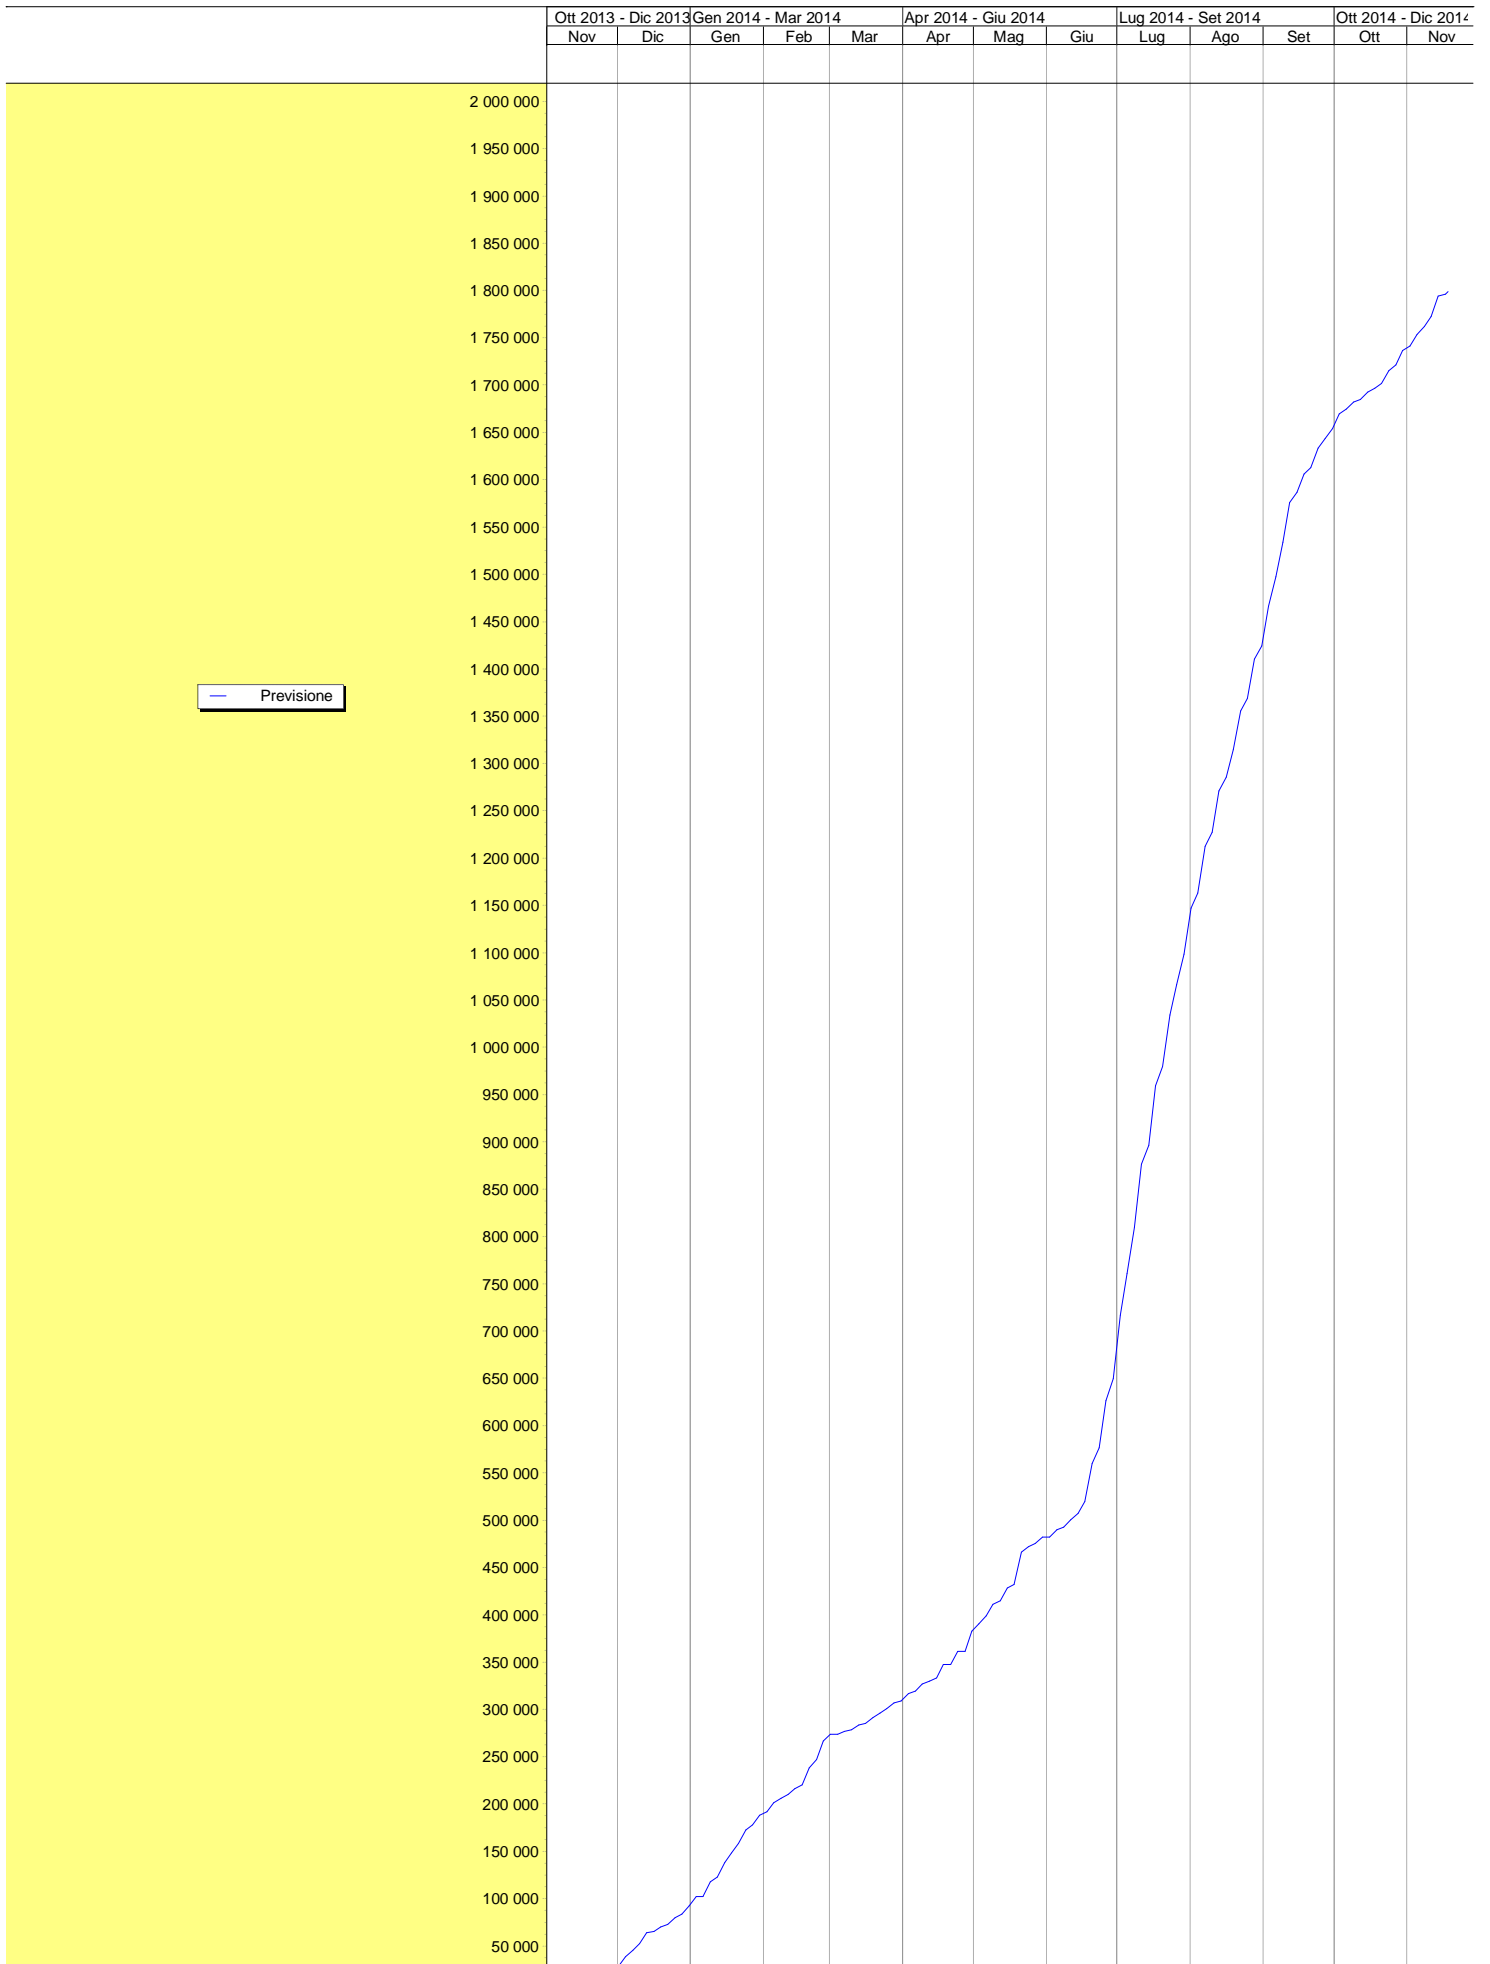

**Comune di Copertino**

**Provincia di Lecce**

# Tabella Attività

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico  
(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte -  
UTC Copertino)

---

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a CORPO</b>	<b>1'798'745,07</b>	<b>100,000</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>252</b>	<b>365</b>
<b>* AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI COPERTINO</b>	<b>1'798'745,07</b>	<b>100,000</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>252</b>	<b>365</b>
<b>** MOVIMENTO TERRE - VIABILITA' - SOTTOSERVIZI - PARCHEGGI</b>	<b>595'274,98</b>	<b>33,094</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>252</b>	<b>365</b>
<b>*** OPERE STRADALI</b>	<b>216'890,43</b>	<b>12,058</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>252</b>	<b>365</b>
**** Impianto di cantiere	18'000,00	1,001	19/11/2013	23/11/2013	4	5
**** Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	37'052,23	2,060	26/11/2013	14/12/2013	14	19
**** Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... a, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)	8'158,95	0,454	03/12/2013	10/01/2014	25	39
**** Formazione di colmate e rilevati secondo le sagome prescr ... nienti da demolizioni, dagli scavi, o da cave di prestito.	3'351,55	0,186	09/12/2013	14/01/2014	23	37
**** Formazione di colmate e rilevati con materiali idonei all ... con misto da cava di prestito al 50% con scampoli di cava.	38'442,71	2,137	20/12/2013	27/01/2014	23	39
**** Costruzione di sottofondo secondo la sagomatura di proget ... co con granulometria 2,5 - 3 dello spessore di cm. 8 - 10.	24'963,22	1,388	23/12/2013	04/02/2014	28	44
**** Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	16'207,64	0,901	09/01/2014	03/02/2014	18	26
**** Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... resi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:	4'007,86	0,223	30/01/2014	12/02/2014	10	14
**** Cilindratura meccanica di pietrisco per massciata del t ... dratura di massciata superficiale di larghezza oltre m 2	4'471,07	0,249	04/02/2014	20/02/2014	13	17
**** Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	15'871,07	0,882	17/02/2014	24/02/2014	6	8
**** Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo ... ne dichiarata. Per macerie edili con impurità fino al 10%.	25'205,33	1,401	20/02/2014	27/02/2014	6	8
**** Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	11'865,00	0,660	08/11/2014	14/11/2014	5	7
**** Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	8'631,00	0,480	12/11/2014	18/11/2014	5	7
**** Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... i attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	662,80	0,037	30/01/2014	08/02/2014	7	10
<b>*** OPERE EDILI: Parti Strutturali</b>	<b>133'005,93</b>	<b>7,394</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>16/07/2014</b>	<b>154</b>	<b>226</b>
**** Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra ... ti demolite: eseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici	6'086,54	0,338	03/12/2013	19/12/2013	13	17
**** Fornitura e posa in opera di muratura retta per fondazion ... ccorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	16'573,76	0,921	06/03/2014	10/05/2014	44	66
**** Fornitura e posa in opera di muratura anche armata esegui ... rte fondale ed il coronamento. Splittato - spessore cm. 20	36'845,40	2,048	06/03/2014	05/07/2014	83	122
**** FORMAZIONE di copertina in cls e/o in manufatti prefabbr ... regola d'arte. Per murature di larghezza di fino a cm 25.	4'860,00	0,270	14/06/2014	16/07/2014	23	33

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio del ... armata, escluso il ferro di armatura. Per sottofondazioni.	6'250,00	0,347	11/12/2013	09/01/2014	18	30
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - classe di resistenza a compressione minima C28/35	30'234,20	1,681	31/12/2013	01/03/2014	42	61
**** Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm	32'156,03	1,788	31/12/2013	01/03/2014	42	61
<b>*** OPERE IDRAULICHE DI SMALTIMENTO</b>	<b>95'094,25</b>	<b>5,287</b>	<b>07/03/2014</b>	<b>13/08/2014</b>	<b>110</b>	<b>160</b>
**** Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a b ... capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 160.	374,49	0,021	28/04/2014	03/06/2014	25	37
**** Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a b ... capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 200.	40,24	0,002	28/04/2014	03/06/2014	25	37
**** Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a b ... capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 630.	632,16	0,035	29/04/2014	04/06/2014	25	37
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in co ... - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917	865,80	0,048	30/04/2014	06/06/2014	26	38
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in co ... rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm	5'778,08	0,321	30/04/2014	06/06/2014	26	38
**** Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in cong ... era. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm	3'903,20	0,217	09/05/2014	13/06/2014	25	36
**** Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norm ... vo antisdrucchiolo aventi dimensioni esterne mm.: 800 x 800	2'632,40	0,146	09/05/2014	13/06/2014	25	36
**** Realizzazione con fornitura e messa in opera delle appare ... con tornanti, in modo da non superare le pendenze idonee.	2'646,00	0,147	09/05/2014	25/06/2014	33	48
**** Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento armato vi ... ento alle discariche del materiale di risulta dagli scavi.	2'167,36	0,120	06/06/2014	19/06/2014	10	14
**** Realizzazione con fornitura e messa in opera delle appare ... zione complessiva a metro lineare dalla base del torrino.	19'470,00	1,082	07/03/2014	08/07/2014	84	124
**** Fornitura e posa in opera dei componenti previsti negli e ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. A corpo.	1'200,00	0,067	17/06/2014	16/07/2014	22	30
**** Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4'413,73	0,245	01/07/2014	17/07/2014	13	17
**** Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... a, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)	2'747,17	0,153	16/04/2014	26/06/2014	35	53
**** periodo 01	1'177,40	0,065	16/04/2014	09/05/2014	15	24
**** periodo 02	1'569,78	0,087	29/05/2014	26/06/2014	20	29
**** Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietil ... i posa. Classe di rigidità SN16 - Diametro esterno mm 315.	11'730,00	0,652	23/04/2014	25/06/2014	34	52
**** periodo 01	5'520,00	0,307	23/04/2014	17/05/2014	16	25
**** periodo 02	6'210,00	0,345	30/05/2014	25/06/2014	18	27
**** Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietil ... i posa. Classe di rigidità SN16 - Diametro esterno mm 400.	544,83	0,030	25/04/2014	23/06/2014	30	47
**** periodo 01	254,39	0,014	25/04/2014	16/05/2014	14	22
**** periodo 02	290,44	0,016	30/05/2014	23/06/2014	16	25
**** Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietil ... i posa. Classe di rigidità SN16 - Diametro esterno mm 630.	5'776,40	0,321	25/04/2014	25/06/2014	29	43

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** periodo 01	2'788,14	0,155	25/04/2014	16/05/2014	14	22
**** periodo 02	2'988,26	0,166	05/06/2014	25/06/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per c ... - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917	11'688,30	0,650	29/04/2014	24/06/2014	25	36
**** periodo 01	5'610,38	0,312	29/04/2014	15/05/2014	12	17
**** periodo 02	6'077,92	0,338	06/06/2014	24/06/2014	13	19
**** Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in cong ... rinfianchi. - dimensioni 100x100x100 sp.12 cm - marcato CE	4'377,51	0,243	29/04/2014	25/06/2014	25	36
**** periodo 01	1'926,10	0,107	29/04/2014	14/05/2014	11	16
**** periodo 02	2'451,41	0,136	06/06/2014	25/06/2014	14	20
**** Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale E ... o antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 400 x 400	1'463,13	0,081	03/06/2014	23/06/2014	15	21
**** Formazione di rinfianchi e ricoprimenti di tubazioni con sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.	4'954,02	0,275	16/07/2014	22/07/2014	5	7
**** Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari ... i materiali sciolti dei gruppi A 1 , A 2-4 , A 2-5 , A 3	6'315,98	0,351	04/07/2014	07/08/2014	25	35
**** Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... I materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.	969,49	0,054	01/08/2014	07/08/2014	5	7
**** Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ta. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità	403,96	0,022	08/08/2014	13/08/2014	4	6
<b>**** OPERE IDRICHE DI ALIMENTAZIONE</b>	<b>48'858,88</b>	<b>2,716</b>	<b>14/12/2013</b>	<b>18/07/2014</b>	<b>147</b>	<b>217</b>
**** Taglio e demolizione di pavimentazione posta al piano in ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2'328,48	0,129	14/12/2013	31/12/2013	10	18
**** Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili	4'660,57	0,259	28/02/2014	03/04/2014	25	35
**** Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietil ... posa. Classe di rigidità SN4 - Diametro esterno mm 160.	4'167,02	0,232	06/03/2014	26/03/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 50 x 4,6.	3'727,10	0,207	12/03/2014	01/04/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in co ... - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917	6'201,44	0,345	19/03/2014	08/04/2014	15	21
**** Formazione di rinfianchi e ricoprimenti di tubazioni con sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.	2'506,29	0,139	19/03/2014	08/04/2014	15	21
**** Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito si ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.	2'287,32	0,127	02/04/2014	08/04/2014	5	7
**** Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari ... i materiali sciolti dei gruppi A 1 , A 2-4 , A 2-5 , A 3	1'347,26	0,075	02/04/2014	08/04/2014	5	7
**** Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... I materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.	6'239,86	0,347	11/07/2014	18/07/2014	6	8
**** Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ta. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità	2'599,94	0,145	11/07/2014	18/07/2014	6	8
**** Fornitura, trasporto, posa in opera, giunzione e prova di ... T a 90'; - riduzioni. I diametri quelli opportuni.	1'176,00	0,065	04/04/2014	06/05/2014	20	33
**** Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norm						



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
... attrezzi: Telaio Quadrato di lato 850 mm. botola Ø 600 mm	2'632,28	0,146	05/04/2014	16/04/2014	8	12
**** Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... nea per fluidi da "20°C a +180°C. -DN = 50 (2")", PN = 35	1'148,04	0,064	02/04/2014	11/04/2014	8	10
**** Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni r ... a tinta unita, pezzatura 8 - 20 mm, parzialmente in vista.	6'218,08	0,346	15/04/2014	13/05/2014	18	29
**** Fornitura e posa in opera di Fontanella in fusione di ghi ... ienico-sanitarie di filtraggio e le relative rubinetterie.	658,00	0,037	07/05/2014	13/05/2014	5	7
**** Allaccio per fontanella in ghisa fornito e posto in opera ... arecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.	775,00	0,043	30/04/2014	07/05/2014	5	8
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... i elementi impropri delle acque di scolo delle fontanelle.	186,20	0,010	03/05/2014	07/05/2014	3	5
<b>*** OPERE ELETTRICHE</b>	<b>101'425,49</b>	<b>5,639</b>	<b>11/04/2014</b>	<b>11/07/2014</b>	<b>62</b>	<b>92</b>
**** Taglio e demolizione di pavimentazione posta al piano in ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2'302,02	0,128	16/04/2014	18/04/2014	3	3
**** Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili	5'647,72	0,314	11/04/2014	20/05/2014	25	40
**** Formazione di rinfianchi e ricoprimenti di tubazioni con sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.	2'599,43	0,145	13/05/2014	20/05/2014	6	8
**** Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari ... i materiali sciolti dei gruppi A 1 , A 2-4 , A 2-5 , A 3	3'008,60	0,167	14/05/2014	20/05/2014	5	7
**** Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... l materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.	7'137,85	0,397	08/07/2014	10/07/2014	3	3
**** Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ta. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità	2'974,10	0,165	09/07/2014	11/07/2014	3	3
**** Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni r ... a tinta unita, pezzatura 8 - 20 mm, parzialmente in vista.	6'147,42	0,342	14/05/2014	23/05/2014	8	10
**** Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media ... ametri (escluso le opere murarie): cavidotto diametro 110;	10'045,04	0,558	18/04/2014	13/05/2014	15	26
**** Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x25 mm2	12'643,00	0,703	16/04/2014	03/05/2014	10	18
**** Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x16 mm2	3'492,00	0,194	17/04/2014	03/05/2014	9	17
**** Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm2	2'924,96	0,163	16/04/2014	03/05/2014	10	18
**** Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x □ 2,5 mm).	4'874,32	0,271	25/04/2014	03/05/2014	4	9
**** Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.	1'296,57	0,072	25/04/2014	03/05/2014	4	9
**** Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli	57,45	0,003	20/05/2014	21/05/2014	2	2
**** Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... ito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A	108,09	0,006	20/05/2014	20/05/2014	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A	235,80	0,013	20/05/2014	20/05/2014	1	1
**** Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... etrapolare da 25A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A	91,99	0,005	20/05/2014	20/05/2014	1	1
**** Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ta di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A tipo AC	142,98	0,008	20/05/2014	20/05/2014	1	1
**** Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in co ... - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917	14'285,70	0,794	20/05/2014	20/05/2014	1	1
**** Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in con ... omputarsi a parte. - dimensioni 130x130 sp.20 cm carrabile	9'523,14	0,529	20/05/2014	20/05/2014	1	1
**** Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini d'ispezi ... io a forma quadrata di lato di 730mm e peso totale di 97kg	4'384,38	0,244	05/07/2014	09/07/2014	3	5
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - classe di resistenza a compressione minima C28/35	3'304,54	0,184	21/05/2014	05/06/2014	11	16
**** Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm	4'198,39	0,233	21/05/2014	05/06/2014	11	16
<b>** LOCULI FUNERARI - STECCHE DA 105 LOCULI</b>	<b>533'254,79</b>	<b>29,646</b>	<b>13/06/2014</b>	<b>15/11/2014</b>	<b>110</b>	<b>156</b>
<b>*** OPERE EDILI: Parti Strutturali</b>	<b>533'254,79</b>	<b>29,646</b>	<b>13/06/2014</b>	<b>15/11/2014</b>	<b>110</b>	<b>156</b>
**** Scarificazione superficiale a sezione ... reso il carico sui mezzi di trasporto.	348,55	0,019	18/06/2014	24/06/2014	5	7
**** Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di m 2,50 ... ezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto.	14'923,44	0,830	19/06/2014	30/06/2014	8	12
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15.	9'115,65	0,507	05/08/2014	19/08/2014	10	15
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - classe di resistenza a compressione minima C28/35	44'542,20	2,476	18/06/2014	08/07/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - classe di resistenza a compressione minima C28/35	84'628,42	4,705	13/06/2014	08/09/2014	61	88
**** Armatura metallica per conglomerato cementizio con le car ... me vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata B450C.	253'707,59	14,105	17/06/2014	10/09/2014	61	86
**** Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	4'429,26	0,246	27/08/2014	10/09/2014	11	15
**** Bocchettoni di piombo per terrazze, v ... Idature, murature ed ogni lavorazione.	1'058,40	0,059	08/09/2014	10/09/2014	3	3
**** Lastra di piombo per converse, complu ... occorrente magistero e pezzi speciali.	846,72	0,047	08/09/2014	10/09/2014	3	3
**** Pluviale in rame o acciaio inox a parete singola munito d ... i mm 1 zincato e plastificato da posizionare ogni ml 2,00.	3'128,16	0,174	05/09/2014	11/09/2014	5	7
**** Manto di asfalto misto a bitume e sabbia lavata dello spessore di 8 mm	2'833,75	0,158	05/09/2014	11/09/2014	5	7
**** Manto impermeabile con guaina da mm 4 armata con "tessuto non tessuto"	8'993,23	0,500	05/09/2014	11/09/2014	5	7

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** Fornitura e posa in opera di coibentazione termica di sol ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	7'333,83	0,408	08/09/2014	15/09/2014	6	8
**** Pavimento solare sulle impermeabilizz ... za; per formati non superiori a mq 50.	17'112,27	0,951	12/09/2014	06/10/2014	17	25
**** Sbruffatura o rinzaffo con malta di c ... con l'ausilio dei ponteggi necessari.	4'564,99	0,254	12/09/2014	08/10/2014	19	27
**** Intonaco rustico esterno con malta dosata con kg 400 di cemento per m3 di sabbia	9'544,35	0,531	19/09/2014	14/10/2014	18	26
**** Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici, spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo.	1'753,46	0,097	01/11/2014	14/11/2014	10	14
**** Dispensore per infissione nel terreno lungo 2,00 m in ope ... l'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). In resina.	1'646,40	0,092	04/11/2014	08/11/2014	4	5
**** Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio car ... riprese del terreno). In resina per dispensore elettrico.	1'058,40	0,059	04/11/2014	08/11/2014	4	5
**** Corda flessibile o tondo in rame nudo ... ello stesso. Di sezione pari a 35 mm2.	1'764,00	0,098	16/10/2014	08/11/2014	17	24
**** Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in ... ario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	6'711,01	0,373	24/10/2014	13/11/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... scale: Spessore 2 cm - Travertino chiaro Rapolato o Romano	15'455,07	0,859	10/10/2014	13/11/2014	25	35
**** Massetto isolante debolmente armato in conglomerato cemen ... erti di argilla espansa e per uno spessore medio di cm 10.	4'692,24	0,261	23/10/2014	12/11/2014	15	21
**** Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera d ... enati spessore cm. 2 - Pietra di Trani normale o Bisceglie	23'575,24	1,311	23/10/2014	15/11/2014	17	24
**** Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... i, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm2	708,00	0,039	23/10/2014	29/10/2014	5	7
**** Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2	772,80	0,043	23/10/2014	29/10/2014	5	7
**** Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2	1'929,60	0,107	22/10/2014	28/10/2014	5	7
**** Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	2'227,20	0,124	04/10/2014	01/11/2014	9	14
**** periodo 01	989,87	0,055	04/10/2014	09/10/2014	4	6
**** periodo 02	1'237,33	0,069	25/10/2014	01/11/2014	5	8
**** Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	883,20	0,049	18/10/2014	04/11/2014	12	18
**** Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.	2'967,36	0,165	18/10/2014	31/10/2014	10	14
<b>** SISTEMAZIONI A VERDE E ARREDO</b>	<b>67'787,91</b>	<b>3,769</b>	<b>08/07/2014</b>	<b>08/11/2014</b>	<b>88</b>	<b>124</b>
<b>** OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE</b>	<b>67'787,91</b>	<b>3,769</b>	<b>08/07/2014</b>	<b>08/11/2014</b>	<b>88</b>	<b>124</b>
**** Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	2'827,78	0,157	10/09/2014	28/10/2014	35	49

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in ... ione per esterni in masselli in cls autobloccanti da cm 6.	18'662,00	1,038	10/09/2014	28/10/2014	35	49
**** Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e ... no alla concorrenza del 90% delle superfici da realizzare.	30'671,63	1,705	08/07/2014	04/11/2014	85	120
**** Rimozione e messa in opera di chiusini per pozzetti in gen ... ed ogni altra opera provvisoria per la rimessa in opera.	825,00	0,046	22/10/2014	04/11/2014	10	14
**** Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Aprice ... ni onere e magistero relativo:- di larghezza pari 15 CM.	9'233,73	0,513	23/09/2014	08/11/2014	34	47
**** Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	4'748,98	0,264	07/10/2014	01/11/2014	19	26
**** Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... resi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:	818,79	0,046	29/10/2014	04/11/2014	5	7
<b>** EDICOLE FUNERARIE PRIVATE - APPARATI FONDALI</b>	<b>602'427,39</b>	<b>33,492</b>	<b>20/06/2014</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>107</b>	<b>152</b>
<b>** OPERE EDILI: Parti Strutturali</b>	<b>602'427,39</b>	<b>33,492</b>	<b>20/06/2014</b>	<b>18/11/2014</b>	<b>107</b>	<b>152</b>
**** Scarificazione superficiale a sezione ... reso il carico sui mezzi di trasporto.	1'362,07	0,076	25/06/2014	15/07/2014	15	21
**** Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di m 2,50 ... ezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto.	68'037,48	3,782	26/06/2014	06/08/2014	30	42
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15.	35'622,15	1,980	27/06/2014	22/07/2014	18	26
**** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - classe di resistenza a compressione minima C28/35	222'254,01	12,356	20/06/2014	15/09/2014	61	88
**** Armatura metallica per conglomerato cementizio con le car ... me vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata B450C.	250'498,51	13,926	27/06/2014	23/09/2014	62	89
**** Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	21'138,37	1,175	23/09/2014	06/10/2014	10	14
**** Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	2'821,12	0,157	12/11/2014	18/11/2014	5	7
**** Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.	693,68	0,039	12/11/2014	18/11/2014	5	7

Copertino, 25/08/2013

**il Tecnico**

ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte  
- UTC Copertino

**Comune di Copertino**

**Provincia di Lecce**

# Tabella Date e Importi

**OGGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI AL NUOVO AMPLIAMENTO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
I STRALCIO ESECUTIVO - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 25/08/2013

Il Tecnico  
(ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte -  
UTC Copertino)

---

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
19/11/2013	4'500,00	4'500,00	0,250
20/11/2013	4'500,00	9'000,00	0,500
21/11/2013	4'500,00	13'500,00	0,751
22/11/2013	4'500,00	18'000,00	1,001
26/11/2013	2'646,59	20'646,59	1,148
27/11/2013	2'646,59	23'293,18	1,295
28/11/2013	2'646,59	25'939,76	1,442
29/11/2013	2'646,59	28'586,35	1,589
02/12/2013	2'646,59	31'232,94	1,736
03/12/2013	3'441,14	34'674,08	1,928
04/12/2013	3'441,14	38'115,22	2,119
05/12/2013	3'441,14	41'556,36	2,310
06/12/2013	3'441,14	44'997,50	2,502
09/12/2013	3'586,86	48'584,36	2,701
10/12/2013	3'586,86	52'171,22	2,900
11/12/2013	3'934,08	56'105,30	3,119
12/12/2013	3'934,08	60'039,39	3,338
13/12/2013	3'934,08	63'973,47	3,557
16/12/2013	1'520,34	65'493,81	3,641
17/12/2013	1'520,34	67'014,15	3,726
18/12/2013	1'520,34	68'534,50	3,810
19/12/2013	1'520,35	70'054,84	3,895
20/12/2013	2'723,57	72'778,41	4,046
23/12/2013	3'615,11	76'393,53	4,247
24/12/2013	3'615,11	80'008,64	4,448
27/12/2013	3'615,11	83'623,75	4,649
30/12/2013	3'615,11	87'238,87	4,850
31/12/2013	5'100,60	92'339,46	5,134
02/01/2014	4'867,75	97'207,21	5,404
03/01/2014	4'867,75	102'074,96	5,675
07/01/2014	4'867,75	106'942,71	5,945
08/01/2014	4'867,75	111'810,45	6,216
09/01/2014	5'768,17	117'578,62	6,537
10/01/2014	5'420,95	122'999,58	6,838
13/01/2014	5'094,59	128'094,17	7,121
14/01/2014	5'094,59	133'188,76	7,405
15/01/2014	4'948,87	138'137,63	7,680
16/01/2014	4'948,87	143'086,50	7,955
17/01/2014	4'948,87	148'035,38	8,230
20/01/2014	4'948,87	152'984,25	8,505
21/01/2014	4'948,87	157'933,12	8,780
22/01/2014	4'948,87	162'881,99	9,055
23/01/2014	4'948,87	167'830,87	9,330
24/01/2014	4'948,87	172'779,74	9,606
27/01/2014	4'948,87	177'728,61	9,881
28/01/2014	3'277,45	181'006,06	10,063
29/01/2014	3'277,45	184'283,51	10,245
30/01/2014	3'772,92	188'056,43	10,455
31/01/2014	3'772,92	191'829,35	10,665
03/02/2014	3'772,92	195'602,27	10,874
04/02/2014	3'216,42	198'818,69	11,053
05/02/2014	2'324,88	201'143,57	11,182
06/02/2014	2'324,88	203'468,45	11,312
07/02/2014	2'324,88	205'793,34	11,441
10/02/2014	2'230,20	208'023,53	11,565
11/02/2014	2'230,20	210'253,73	11,689
12/02/2014	2'230,20	212'483,93	11,813
13/02/2014	1'829,41	214'313,34	11,915
14/02/2014	1'829,41	216'142,75	12,016
17/02/2014	4'474,59	220'617,34	12,265
18/02/2014	4'474,59	225'091,93	12,514
19/02/2014	4'474,59	229'566,52	12,763
20/02/2014	8'675,48	238'242,00	13,245

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
21/02/2014	8'331,55	246'573,54	13,708
24/02/2014	8'331,55	254'905,09	14,171
25/02/2014	5'686,37	260'591,46	14,487
26/02/2014	5'686,37	266'277,83	14,804
27/02/2014	5'686,37	271'964,20	15,120
28/02/2014	1'671,90	273'636,11	15,213
03/03/2014	186,42	273'822,53	15,223
04/03/2014	186,42	274'008,95	15,233
05/03/2014	186,42	274'195,38	15,244
06/03/2014	1'284,82	275'480,20	15,315
07/03/2014	1'516,61	276'996,81	15,399
10/03/2014	1'516,61	278'513,41	15,484
11/03/2014	1'516,61	280'030,02	15,568
12/03/2014	1'765,08	281'795,10	15,666
13/03/2014	1'765,08	283'560,18	15,764
14/03/2014	1'765,08	285'325,26	15,862
17/03/2014	1'765,08	287'090,34	15,961
18/03/2014	1'765,08	288'855,42	16,059
19/03/2014	2'345,60	291'201,01	16,189
20/03/2014	2'345,60	293'546,61	16,320
21/03/2014	2'345,60	295'892,21	16,450
24/03/2014	2'345,60	298'237,80	16,580
25/03/2014	2'345,60	300'583,40	16,711
26/03/2014	2'345,59	302'928,99	16,841
27/03/2014	2'067,79	304'996,78	16,956
28/03/2014	2'067,79	307'064,58	17,071
31/03/2014	2'067,79	309'132,37	17,186
01/04/2014	2'067,79	311'200,16	17,301
02/04/2014	2'689,74	313'889,90	17,450
03/04/2014	2'689,74	316'579,64	17,600
04/04/2014	2'562,12	319'141,76	17,742
07/04/2014	2'891,15	322'032,91	17,903
08/04/2014	2'891,15	324'924,07	18,064
09/04/2014	1'583,72	326'507,79	18,152
10/04/2014	1'583,72	328'091,51	18,240
11/04/2014	1'809,64	329'901,15	18,341
14/04/2014	1'666,13	331'567,27	18,433
15/04/2014	2'011,58	333'578,85	18,545
16/04/2014	4'414,21	337'993,06	18,790
17/04/2014	4'473,17	342'466,23	19,039
18/04/2014	5'142,84	347'609,07	19,325
22/04/2014	4'375,50	351'984,56	19,568
23/04/2014	4'720,50	356'705,06	19,831
24/04/2014	4'720,50	361'425,56	20,093
28/04/2014	6'497,13	367'922,70	20,454
29/04/2014	7'165,05	375'087,75	20,853
30/04/2014	7'575,59	382'663,34	21,274
02/05/2014	7'575,59	390'238,92	21,695
05/05/2014	4'150,14	394'389,06	21,926
06/05/2014	4'150,14	398'539,20	22,157
07/05/2014	4'222,94	402'762,13	22,391
08/05/2014	4'005,87	406'768,00	22,614
09/05/2014	4'347,47	411'115,48	22,856
12/05/2014	3'892,31	415'007,78	23,072
13/05/2014	4'325,55	419'333,33	23,313
14/05/2014	4'548,97	423'882,30	23,565
15/05/2014	4'373,87	428'256,17	23,809
16/05/2014	3'906,34	432'162,51	24,026
19/05/2014	3'344,02	435'506,53	24,212
20/05/2014	27'760,44	463'266,97	25,755
21/05/2014	2'793,96	466'060,94	25,910
22/05/2014	2'765,23	468'826,17	26,064
23/05/2014	2'765,24	471'591,41	26,218

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
26/05/2014	1'996,81	473'588,21	26,329
27/05/2014	1'996,81	475'585,02	26,440
28/05/2014	1'996,81	477'581,83	26,551
29/05/2014	2'075,30	479'657,12	26,666
30/05/2014	2'438,45	482'095,57	26,802
03/06/2014	2'535,99	484'631,56	26,943
04/06/2014	2'519,40	487'150,96	27,083
05/06/2014	2'693,33	489'844,29	27,233
06/06/2014	2'870,61	492'714,90	27,392
09/06/2014	2'615,08	495'329,98	27,538
10/06/2014	2'615,08	497'945,06	27,683
11/06/2014	2'615,08	500'560,14	27,828
12/06/2014	2'615,08	503'175,22	27,974
13/06/2014	4'002,44	507'177,66	28,196
16/06/2014	3'952,31	511'129,97	28,416
17/06/2014	8'166,00	519'295,97	28,870
18/06/2014	11'205,19	530'501,16	29,493
19/06/2014	13'070,62	543'571,78	30,220
20/06/2014	16'497,39	560'069,17	31,137
23/06/2014	16'497,39	576'566,56	32,054
24/06/2014	16'381,69	592'948,25	32,965
25/06/2014	15'935,26	608'883,51	33,850
26/06/2014	17'403,68	626'287,19	34,818
27/06/2014	23'344,49	649'631,68	36,116
30/06/2014	23'344,49	672'976,18	37,414
01/07/2014	21'818,58	694'794,76	38,627
02/07/2014	21'818,58	716'613,34	39,840
03/07/2014	21'818,58	738'431,92	41,053
04/07/2014	22'071,22	760'503,14	42,280
07/07/2014	23'088,76	783'591,90	43,563
08/07/2014	25'828,89	809'420,79	44,999
09/07/2014	23'618,99	833'039,78	46,312
10/07/2014	22'157,53	855'197,31	47,544
11/07/2014	21'251,55	876'448,85	48,726
14/07/2014	20'260,18	896'709,03	49,852
15/07/2014	20'260,17	916'969,20	50,978
16/07/2014	21'160,18	938'129,38	52,155
17/07/2014	20'894,33	959'023,71	53,316
18/07/2014	20'554,81	979'578,51	54,459
21/07/2014	19'081,51	998'660,02	55,520
22/07/2014	19'081,51	1'017'741,53	56,581
23/07/2014	16'111,70	1'033'853,23	57,476
24/07/2014	16'111,70	1'049'964,92	58,372
25/07/2014	16'111,70	1'066'076,62	59,268
28/07/2014	16'111,70	1'082'188,32	60,164
29/07/2014	16'111,70	1'098'300,01	61,059
30/07/2014	16'111,70	1'114'411,71	61,955
31/07/2014	16'111,70	1'130'523,41	62,851
01/08/2014	16'305,60	1'146'829,00	63,757
04/08/2014	16'305,60	1'163'134,60	64,664
05/08/2014	17'217,16	1'180'351,76	65,621
06/08/2014	17'217,16	1'197'568,92	66,578
07/08/2014	14'949,25	1'212'518,17	67,409
08/08/2014	14'603,70	1'227'121,86	68,221
11/08/2014	14'603,70	1'241'725,56	69,033
12/08/2014	14'603,70	1'256'329,25	69,845
13/08/2014	14'603,70	1'270'932,95	70,657
14/08/2014	14'502,71	1'285'435,66	71,463
18/08/2014	14'502,71	1'299'938,36	72,269
19/08/2014	14'502,71	1'314'441,08	73,075
20/08/2014	13'591,14	1'328'032,22	73,831
21/08/2014	13'591,14	1'341'623,36	74,587
22/08/2014	13'591,14	1'355'214,50	75,342



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
25/08/2014	13'591,14	1'368'805,64	76,098
26/08/2014	13'591,14	1'382'396,78	76,853
27/08/2014	13'993,80	1'396'390,58	77,631
28/08/2014	13'993,80	1'410'384,39	78,409
29/08/2014	13'993,80	1'424'378,19	79,187
01/09/2014	13'993,80	1'438'371,99	79,965
02/09/2014	13'993,80	1'452'365,79	80,743
03/09/2014	13'993,80	1'466'359,59	81,521
04/09/2014	13'993,80	1'480'353,39	82,299
05/09/2014	16'984,83	1'497'338,22	83,243
08/09/2014	18'842,17	1'516'180,40	84,291
09/09/2014	17'454,82	1'533'635,22	85,261
10/09/2014	18'068,82	1'551'704,04	86,266
11/09/2014	12'871,98	1'564'576,02	86,982
12/09/2014	11'127,81	1'575'703,83	87,600
15/09/2014	11'127,82	1'586'831,65	88,219
16/09/2014	6'262,00	1'593'093,66	88,567
17/09/2014	6'262,00	1'599'355,66	88,915
18/09/2014	6'262,00	1'605'617,66	89,263
19/09/2014	6'792,24	1'612'409,90	89,641
22/09/2014	6'792,24	1'619'202,14	90,018
23/09/2014	9'177,66	1'628'379,81	90,529
24/09/2014	5'137,36	1'633'517,17	90,814
25/09/2014	5'137,36	1'638'654,53	91,100
26/09/2014	5'137,36	1'643'791,89	91,385
29/09/2014	5'137,36	1'648'929,25	91,671
30/09/2014	5'137,36	1'654'066,61	91,957
01/10/2014	5'137,36	1'659'203,98	92,242
02/10/2014	5'137,36	1'664'341,34	92,528
03/10/2014	5'137,36	1'669'478,70	92,814
06/10/2014	5'384,83	1'674'863,53	93,113
07/10/2014	2'514,34	1'677'377,86	93,253
08/10/2014	2'514,33	1'679'892,20	93,392
09/10/2014	2'274,07	1'682'166,27	93,519
10/10/2014	2'644,81	1'684'811,08	93,666
13/10/2014	2'644,81	1'687'455,89	93,813
14/10/2014	2'644,81	1'690'100,69	93,960
15/10/2014	2'114,57	1'692'215,26	94,078
16/10/2014	2'218,33	1'694'433,59	94,201
17/10/2014	2'218,33	1'696'651,92	94,324
20/10/2014	2'588,67	1'699'240,58	94,468
21/10/2014	2'588,67	1'701'829,25	94,612
22/10/2014	3'057,09	1'704'886,34	94,782
23/10/2014	5'052,84	1'709'939,18	95,063
24/10/2014	5'500,24	1'715'439,42	95,369
27/10/2014	5'747,71	1'721'187,13	95,688
28/10/2014	5'747,70	1'726'934,83	96,008
29/10/2014	4'911,55	1'731'846,38	96,281
30/10/2014	4'615,39	1'736'461,78	96,537
31/10/2014	4'615,40	1'741'077,17	96,794
03/11/2014	3'996,59	1'745'073,76	97,016
04/11/2014	4'672,79	1'749'746,55	97,276
05/11/2014	3'992,09	1'753'738,64	97,498
06/11/2014	3'992,09	1'757'730,73	97,720
07/11/2014	3'992,09	1'761'722,82	97,942
10/11/2014	5'313,54	1'767'036,36	98,237
11/11/2014	5'313,54	1'772'349,91	98,533
12/11/2014	7'742,71	1'780'092,62	98,963
13/11/2014	7'429,88	1'787'522,50	99,376
14/11/2014	6'364,29	1'793'886,79	99,730
17/11/2014	2'429,16	1'796'315,95	99,865
18/11/2014	2'429,16	1'798'745,11	100,000

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)

Copertino, 25/08/2013

**il Tecnico**

ing. Antonio Verdesca, geom. Sandro Pagano, geom. Luca Conte - UTC Copertino
