



COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Iniziative a sostegno dei giovani – Piano d’azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori urbani in rete” dell'APQ Rafforzato “ Sviluppo Locale (Del. C.I.P.E. n. 92/2012)

Immobile di Via Spallanzani

PROGETTO ESECUTIVO

SIC. 1 - ALL. A	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)
DATA	GIUGNO 2016

R.U.P. e PROGETTISTA	Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
---------------------------------	-----------------------------------

ALLEGATO "A"

Comune di Copertino

Provincia di Le

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

- OGGETTO:** Iniziative a sostegno dei giovani – Piano d'azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori urbani in rete " dell'APQ Rafforzato "Sviluppo Locale (Del. C.I.P.E. n. 92/2012)". Realizzazione di una sala di registrazione musicale presso l'immobile Comunale di via Spallanzani
- COMMITTENTE:** Comune di Copertino
- CANTIERE:** Via Spallanzani, Copertino (Le)

Copertino, 23/06/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Ingegnere ZACHEO Rocco Maurizio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco P.T. SCHITO Sandrina)

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g		Z1	1							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g		Z1	1							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1	1							
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g		Z1	1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1	1							
Smobilizzo del cantiere	1 g										
Demolizione di pareti divisorie	3 g			Z1	3						
Rimozione di massetto	3 g						Z1	3			
Rimozione di pavimenti interni	2 g										
Rimozione di serramenti interni	1 g										
Posa macchina di condizionamento	2 g										
Realizzazione di impianto antintrusione	3 g										
Realizzazione di impianto elettrico interno	10 g										
Posa di serramenti esterni	5 g										
Realizzazione di divisori interni	10 g										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5 g										
Posa di serramenti interni	4 g										
Formazione di massetto per pavimenti interni	2 g										
Posa di pavimenti per interni	5 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1 g										
Scavo di sbancamento	2 g										
Realizzazione di vespaio per muri controterra	1 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

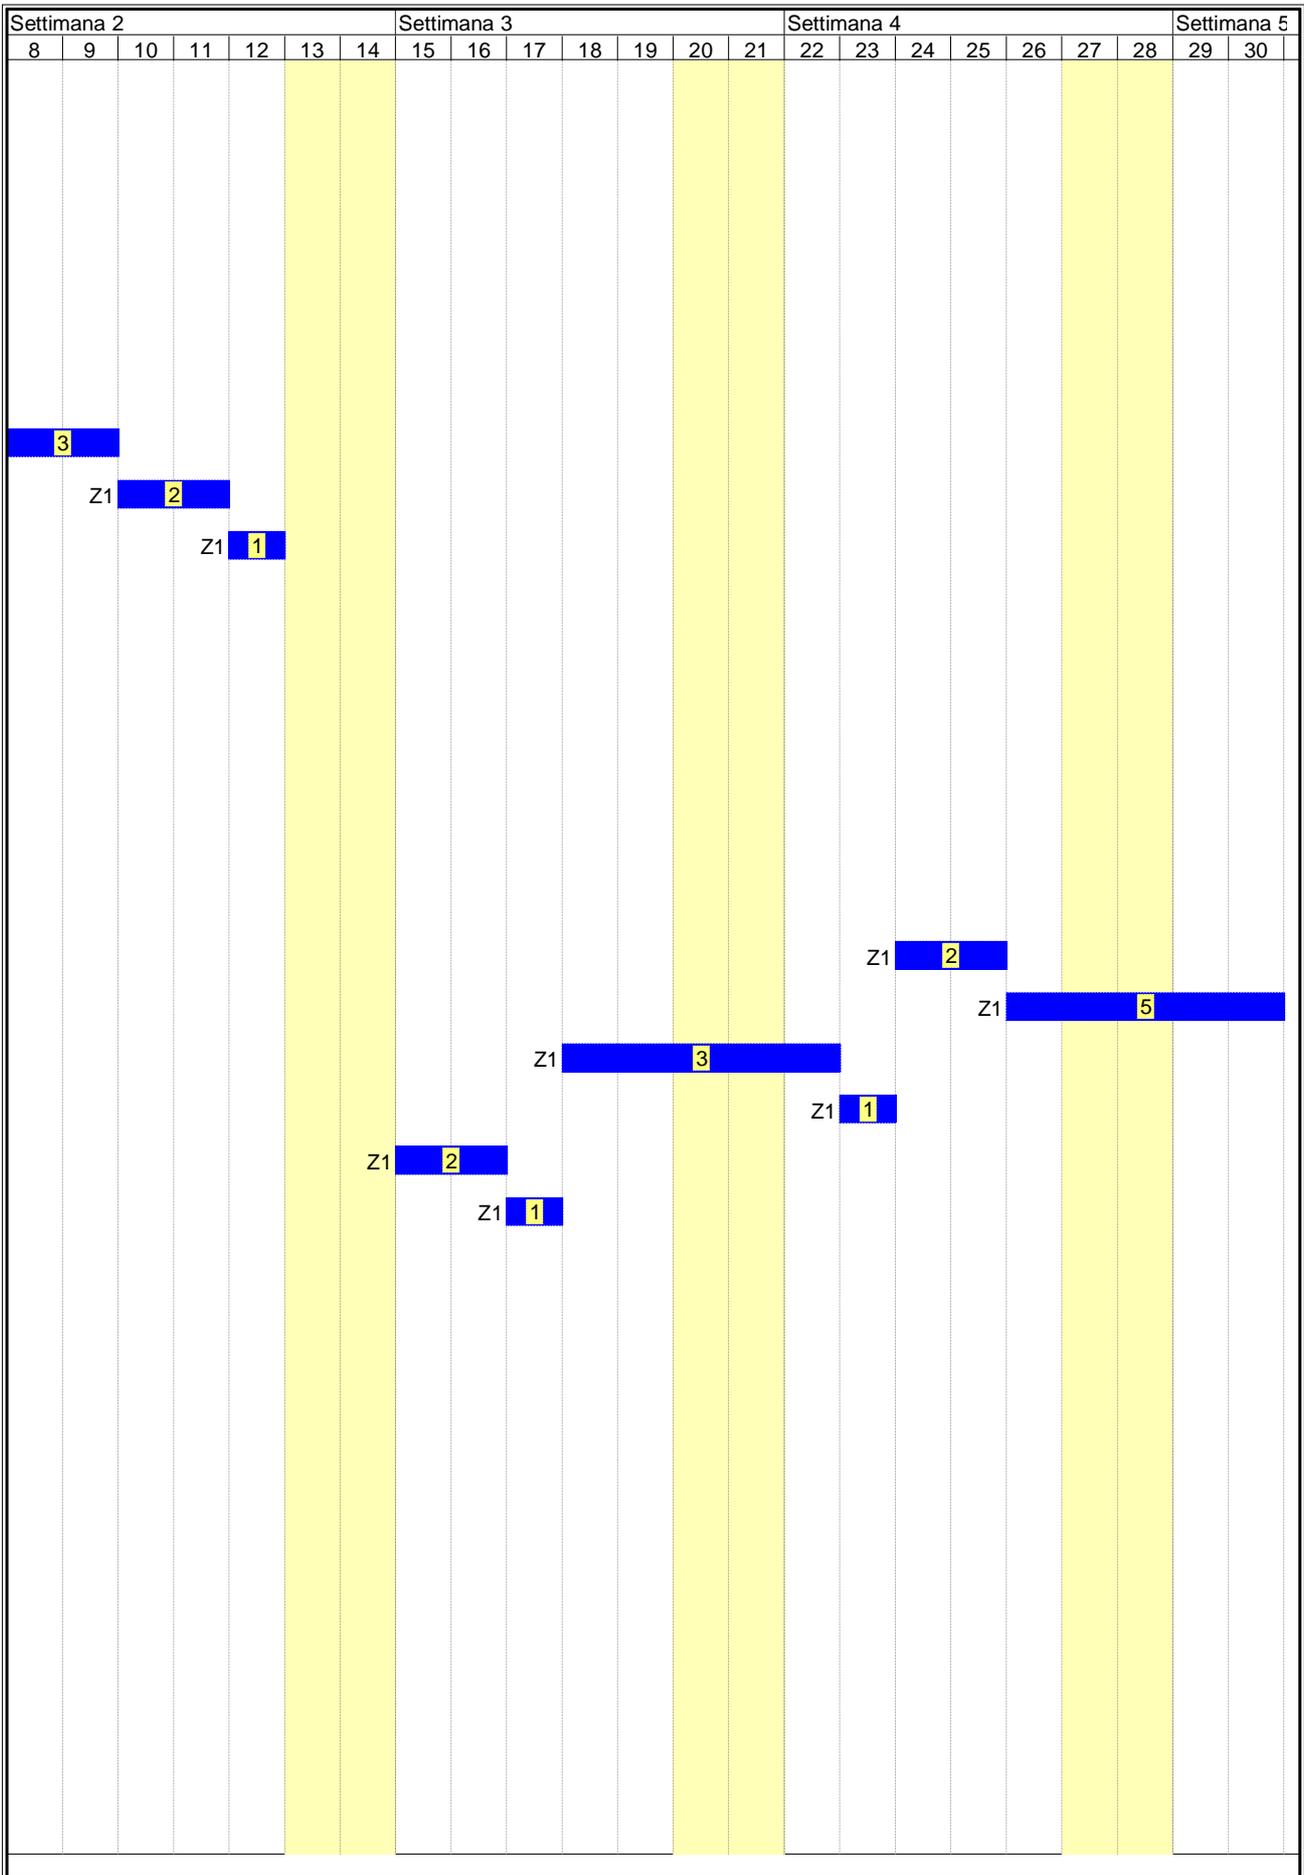

5	Settimana 6					Settimana 7					Settimana 8												
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

