



COMUNE DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

DELIBERA C.I.P.E. N. 6/2012 – G.U.R.I. N. 88 DEL 14/04/2012

Edificio scolastico – Scuola Media di Via Regina Isabella

PROGETTO ESECUTIVO

ALL. A	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DATA	APRILE 2016

R.U.P.	Geom. Sandro PAGANO
PROGETTISTA	Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
COLLABORATORE	Geom. Luca CONTE

ALLEGATO "A"

Comune di Copertino

Provincia di Lecce

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. (Del. C.I.P.E. n. 6/2012 - G.U.R.I. n. 88/2012) - Scuola Media di via Regina Isabella

COMMITTENTE: Comune di Copertino


CANTIERE: Via Regina Isabella, Copertino (Le)


Copertino, 16/04/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Zacheo Rocco Maurizio)

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z2	1						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g		Z2	1						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g				Z1	1				
Smobilizzo del cantiere	1 g									
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g					Z1		3		
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g									
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2 g									
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	7 g									
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g									
Posa di rivestimenti interni	3 g									
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	4 g									
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g									
Posa di pavimenti per esterni	5 g									
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie	1 g									
Tinteggiatura di superfici interne	5 g									
Revisione di lastrico solare di coperture	13 g									
LEGENDA Zona:										
Z1 = Scuola										
Z2 = Esterno Edificio										

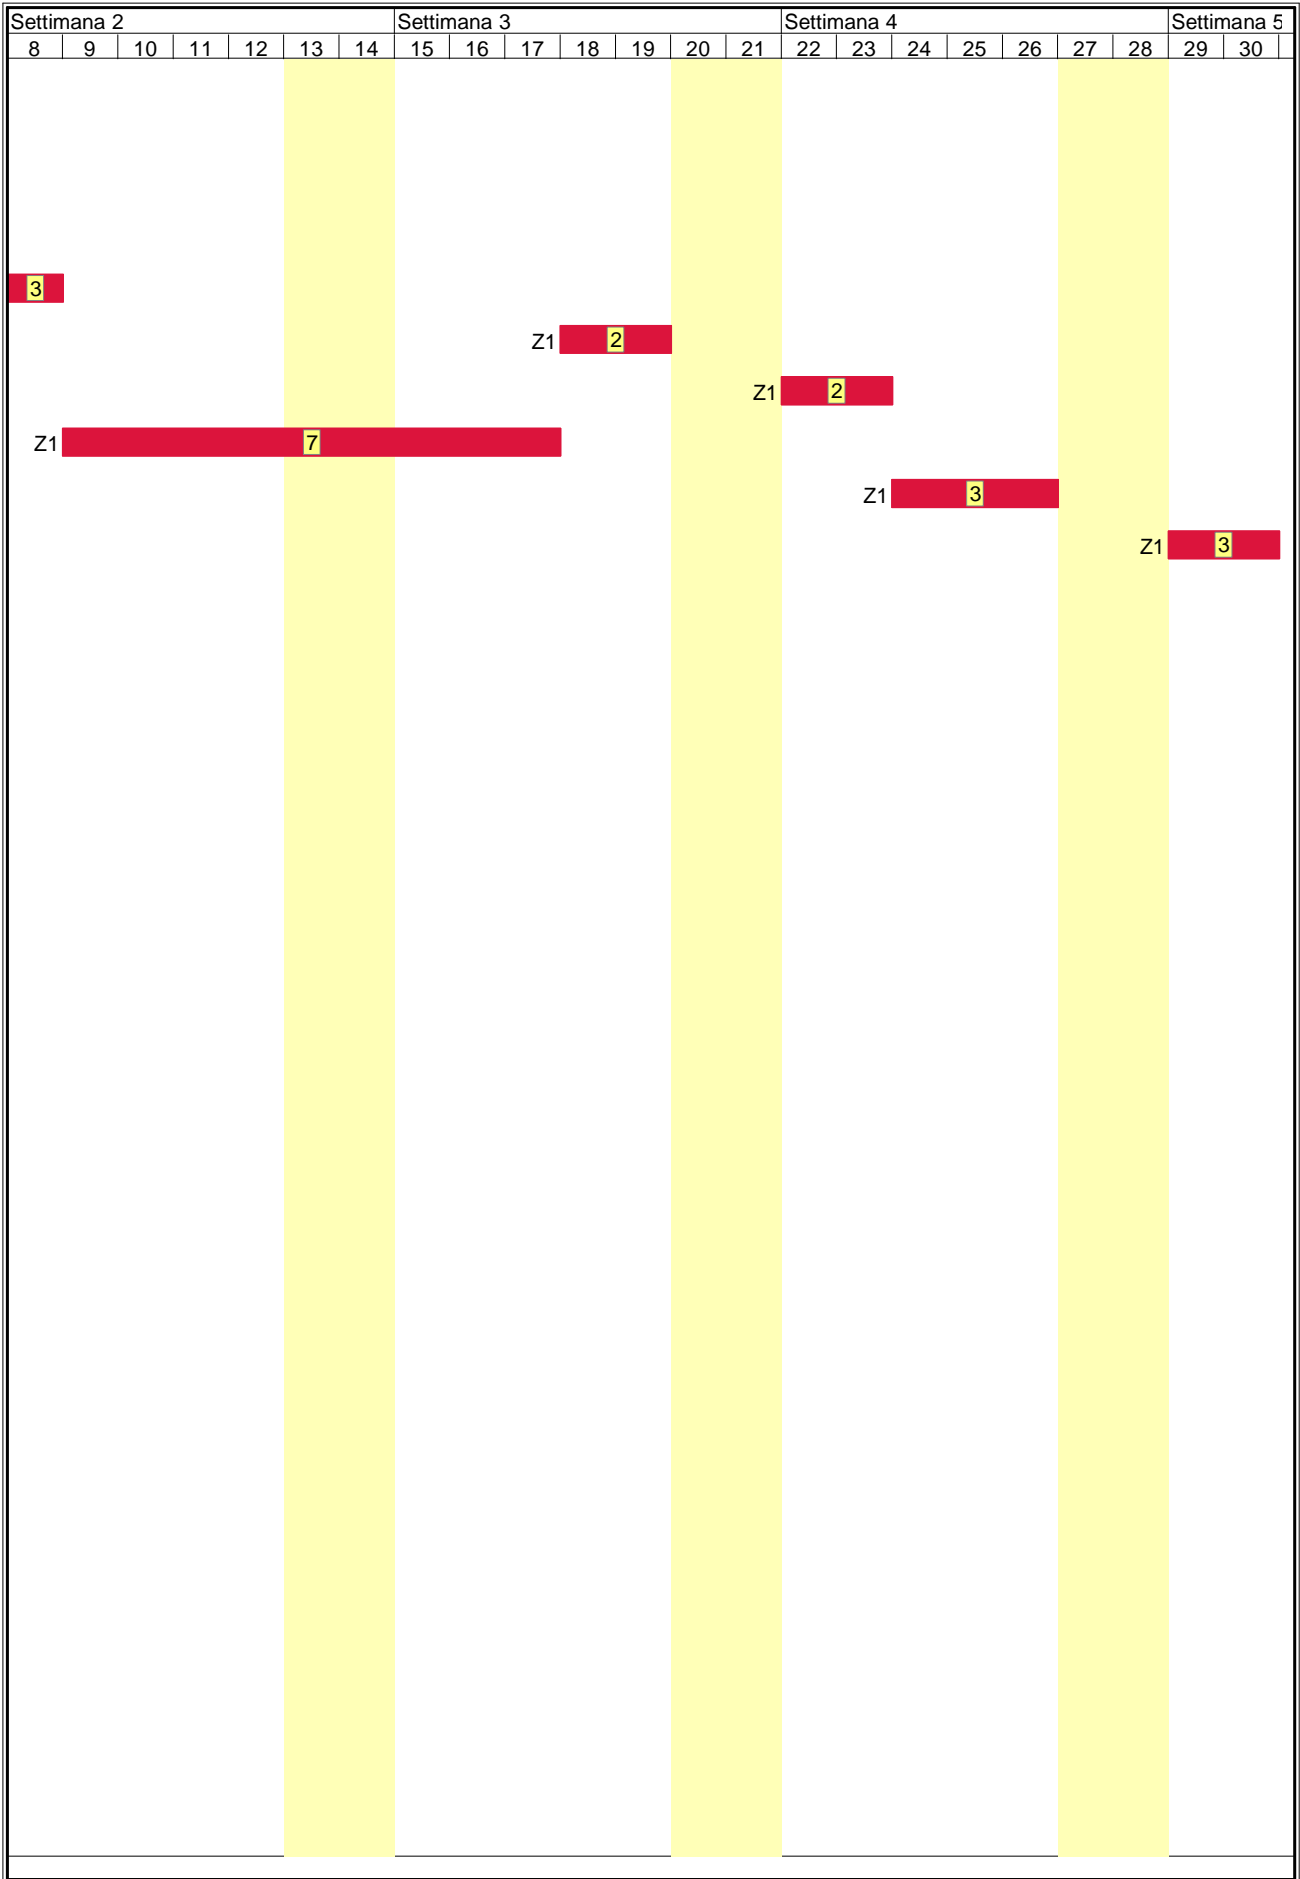

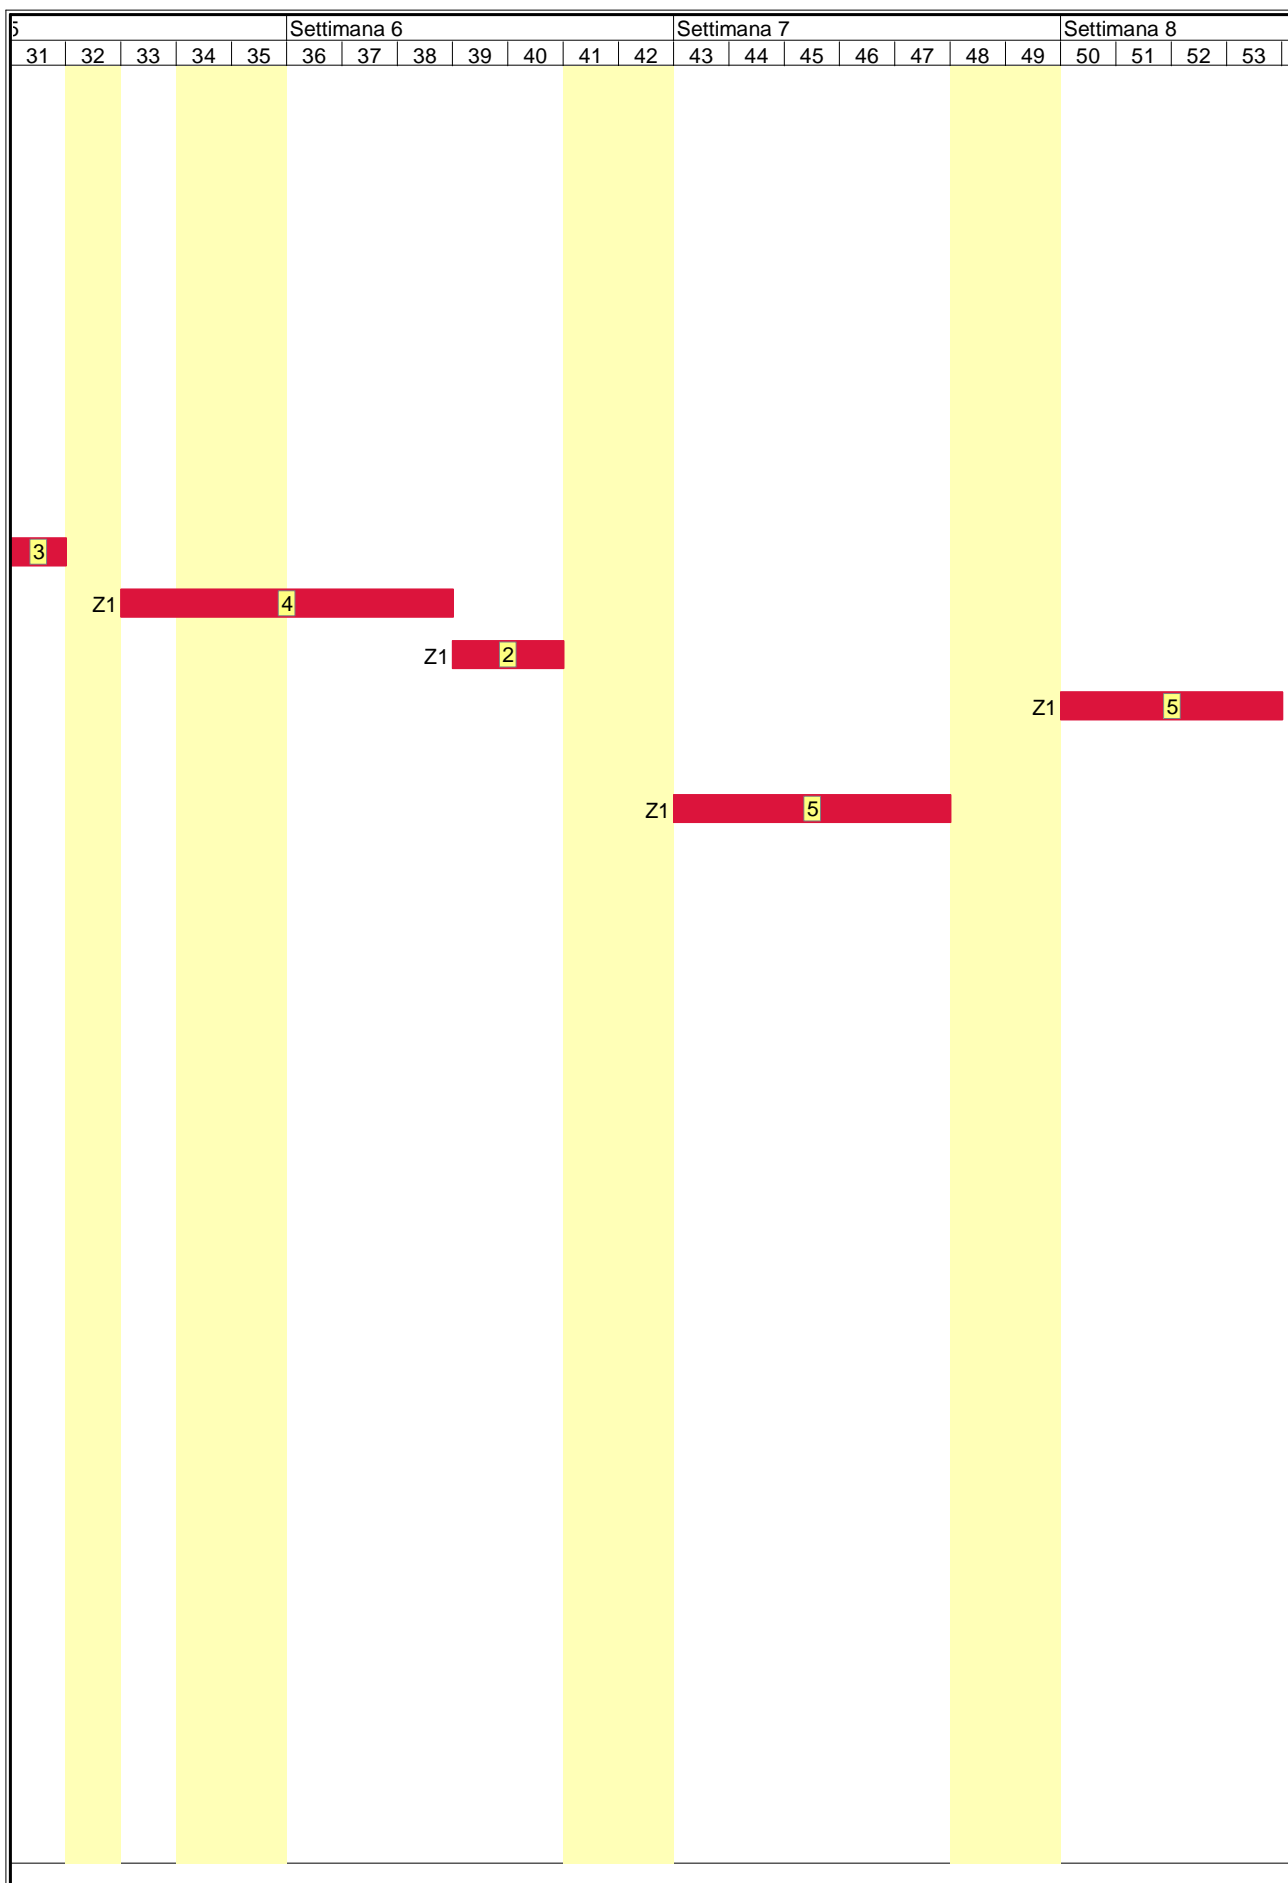

Settimana 9			Settimana 10						Settimana 11														
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
5			Z1 13																			Z2 1	
																						Z1 1	
