



REGIONE PUGLIA - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PIRP

COMUNE DI COPERTINO - PROVINCIA DI LECCE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Intervento di trasformazione integrata per la riqualificazione delle aree di "Gelsi" e "Sciampo"

"Unire oltre i binari"

PROGETTO ESECUTIVO



MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI UN PARCO ATTREZZATO IN "ZONA GELSI"

ALLEGATO 5

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA
Arch. Petrelli Stefania

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pagano Sandro

Accordo di Programma - Giunta Regionale e Comune di Copertino in data 29 gennaio 2010

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	2	2	Giorno 1	Giorno 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	Giorno 1	Giorno 1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	Giorno 1	Giorno 2
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	1	3	3	Giorno 3	Giorno 8
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	1	2	2	Giorno 9	Giorno 11
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	1	1	1	Giorno 12	Giorno 12
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	6	9	Giorno 13	Giorno 20
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	2	2	Giorno 21	Giorno 23
Posa di condotta idrica e apparecchi inaffianti	1	1	2	2	Giorno 24	Giorno 25
Formazione di tappeto erboso	1	1	2	4	Giorno 26	Giorno 28
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	Giorno 29	Giorno 30

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	G																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	Z1	█																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	█																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g		Z1	█																	
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	3 g			Z1	█																
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2 g							Z1	█												
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g									Z1	█										
Posa di pali per pubblica illuminazione	6 g									Z1	█										
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																				
Posa di conduttura idrica e apparecchi inaffianti	2 g																				
Formazione di tappeto erboso	2 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = ZONA UNICA																					

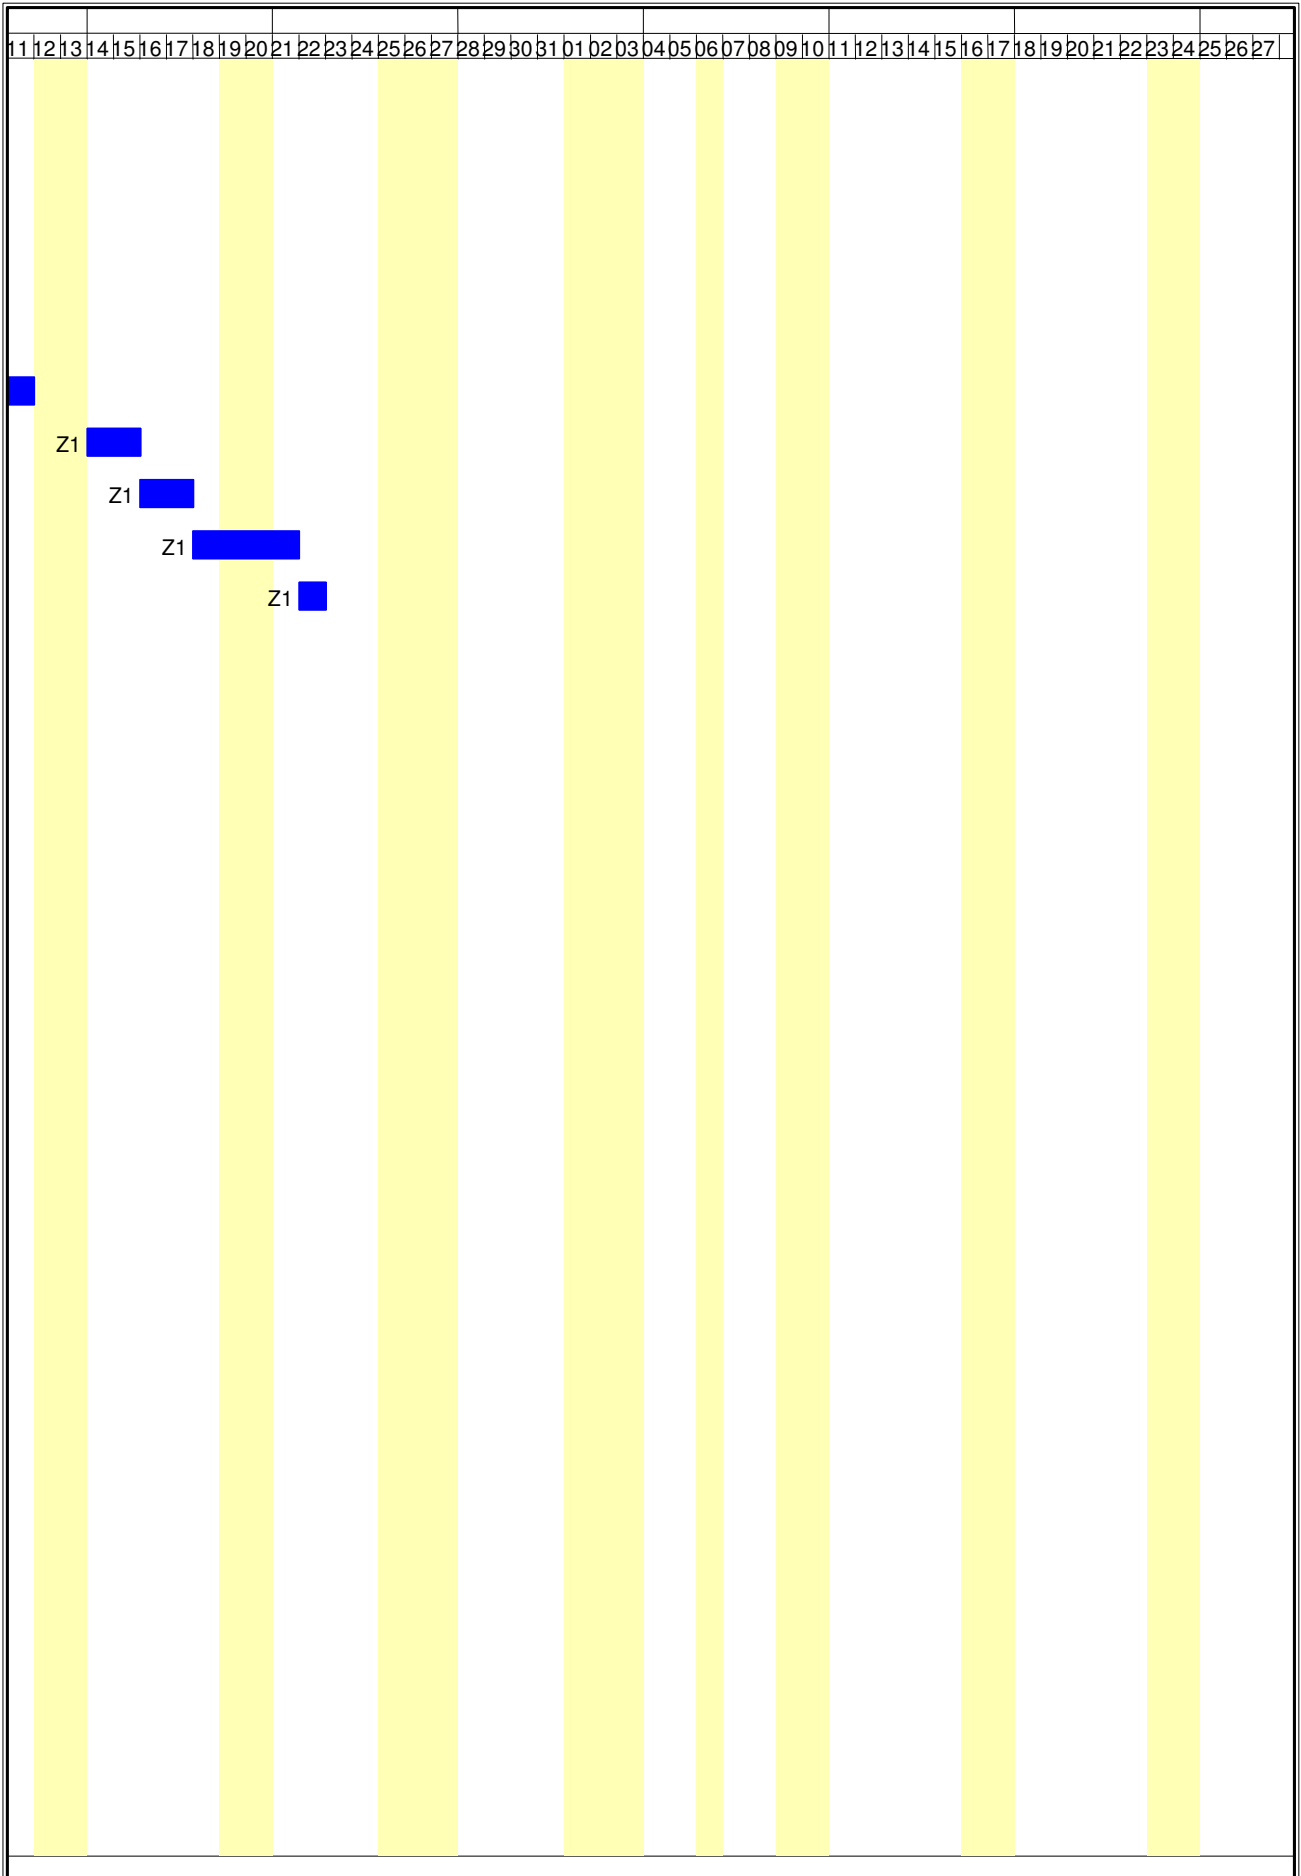

Miglioramento funzionale di un parco attrezzato in zona Gelsi
