## **Comune di Copertino**

#### Provincia di Lecce

# Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie -

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE PEDONLI P.E.E.P. in località "Sciarpo"


PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 03/11/2015

II Tecnico (ing. Aldo Martina)

Intervento di trasformazione integrata per la qualificazione dell'Area "Sciarpo".

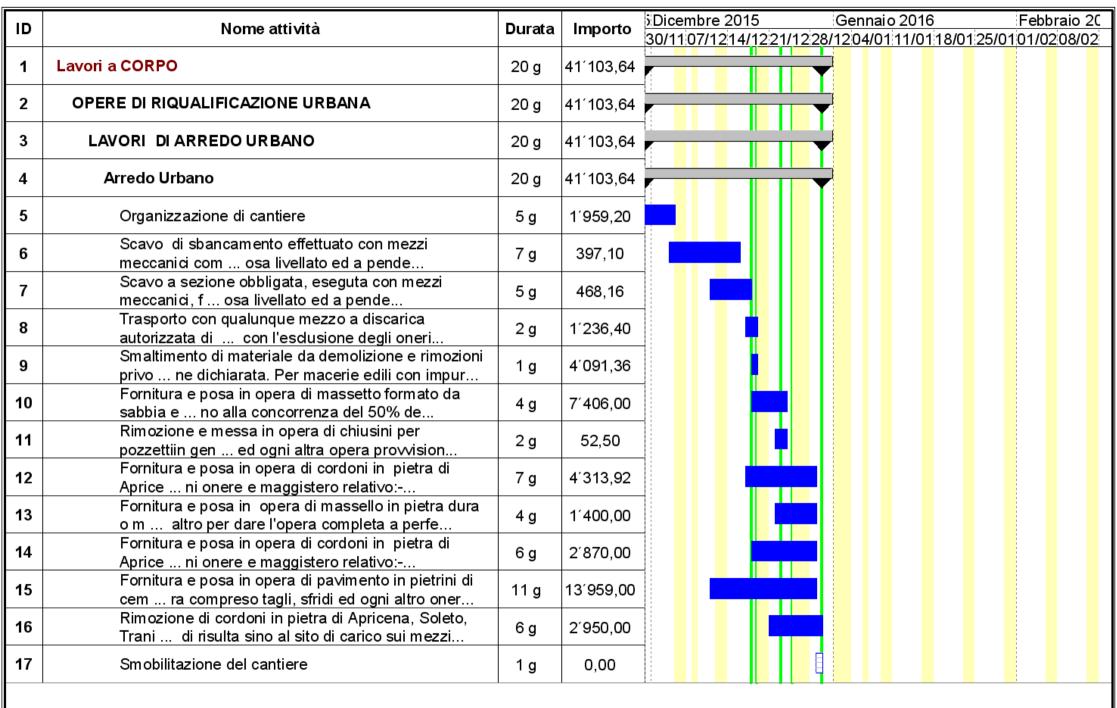

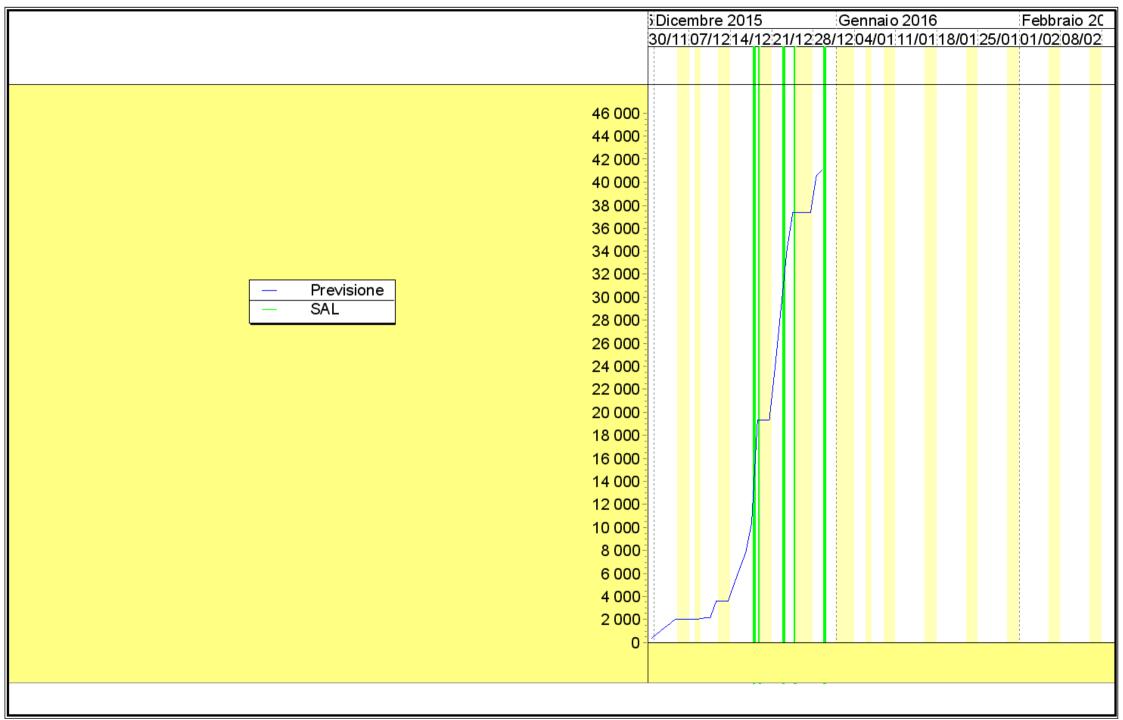

## **Comune di Copertino**

#### Provincia di Lecce

## Tabella Attività

OGGETTO: REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie -

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE PEDONLI P.E.E.P. in località "Sciarpo"

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 03/11/2015

II Tecnico (ing. Aldo Martina)

Intervento di trasformazione integrata per la qualificazione dell'Area "Sciarpo".

					Г	
ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)	1111210	 	Lav.	Tot.
Lavori a CORPO	41 103,64	100,000	30/11/2015	29/12/2015	20	30
* OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	41 103,64	100,000	30/11/2015	29/12/2015	20	30
* * LAVORI DI ARREDO URBANO	41 103,64	100,000	30/11/2015	29/12/2015	20	30
* * * Arredo Urbano	41 103,64	100,000	30/11/2015	29/12/2015	20	30
* * * * Organizzazione di cantiere	1′959,20	4,766	30/11/2015	04/12/2015	5	5
* * * * Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici com osa livellato ed a pendenza prestabilita in fas di lavoro.	397,10	0,966	04/12/2015	15/12/2015	7	12
* * * * Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, f osa livellato ed a pendenza presabilita in fase di lavoro.	468,16	1,139	11/12/2015	17/12/2015	5	7
* * * * Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	1′236,40	3,008	17/12/2015	18/12/2015	2	2
* * * * Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo ne dichiarata. Per macerie edili con impurità fino al 10%.	4′091,36	9,954	18/12/2015	18/12/2015	1	1
* * * * Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e no alla concorrenza del 50% delle superfici da realizzare.	7′406,00	18,018	18/12/2015	23/12/2015	4	6
* * * * Rimozione e messa in opera di chiusini per pozzettiin gen ed ogni altra opera provvisionale per la rimessa in opera.	52,50	0,128	22/12/2015	23/12/2015	2	2
* * * * Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Aprice ni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari 15 CM.	4′313,92	10,495	17/12/2015	28/12/2015	7	12
* * * * Fornitura e posa in opera di massello in pietra dura o m altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1′400,00	3,406	22/12/2015	28/12/2015	4	7
* * * * Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Aprice ni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari 8/9 cm	2′870,00	6,982	18/12/2015	28/12/2015	6	11
* * * * Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cem ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.	13′959,00	33,960	11/12/2015	28/12/2015	11	18
* * * * Rimozione di cordoni in pietra di Apricena, Soleto, Trani di risulta sino al sito di carico sui mezzi di trasporto.	2′950,00	7,177	21/12/2015	29/12/2015	6	9
* * * * Smobilitazione del cantiere	0,00	0,000	29/12/2015	29/12/2015	1	1
Copertino, 03/11/2015						
Copertino, 03/17/2013						
Tecnico						
ing. Aldo Martina						

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino TABELLA DELLE ATTIVITA'

## **Comune di Copertino**

#### Provincia di Lecce

## Tabella Date e Importi

OGGETTO: REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie -

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE PEDONLI P.E.E.P. in località "Sciarpo"

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

Copertino, 03/11/2015

II Tecnico (ing. Aldo Martina)

Intervento di trasformazione integrata per la qualificazione dell'Area "Sciarpo".

	IMPORTI PREVISTI				
DATA		Progressivo euro	(%)		
30/1/2015 02/1/2015 02/1/2015 04/1/2015 04/1/2015 04/1/2015 04/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 11/1/2015 21/1/2015	391,84 391,84 391,84 448,57 56,73 56,73 1,419,36 1,419,36 1,362,63 2,597,10 8,924,67 4,706,77 5,083,02 5,083,02 3,205,27 3,205,27 491,67	391,84 783,68 1'175,52 1'567,36 2'015,93 2'072,66 2'129,39 2'186,11 3'605,47 5'024,84 6'444,20 7'806,83 10'403,93 19'328,60 24'035,38 29'118,40 34'201,42 37'406,70 40'611,97 41'103,64	2,860 3,813 4,905 5,043 5,181 5,319 8,772 12,225 15,678 18,993 25,311 47,024 58,475 70,841 83,208 91,006 98,804		

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino TABELLA DATE ED IMPORTI
